




Derde rapportage

Project Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre.

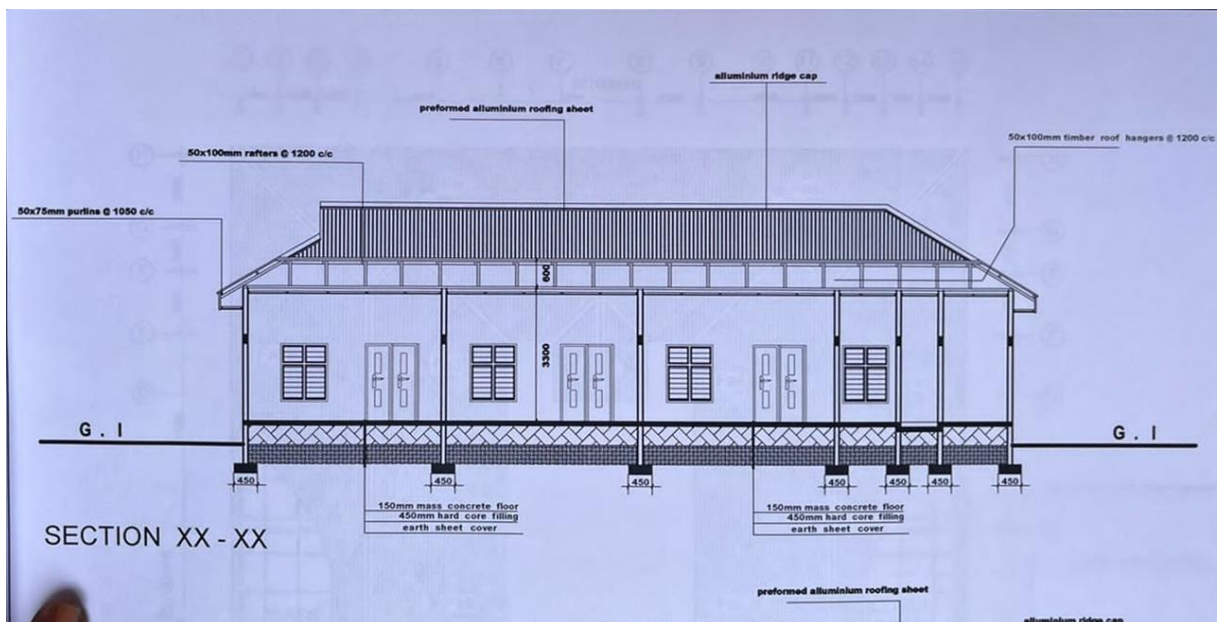

Titel: Derde rapportage Project Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre.

Versie: 1.0

Datum: 25-5-2026

Met bijdragen van: Harry van den Heerik, Barend Nieuwendijk

Stichting GoedWerkGhana

www.goedwerkghana.nl



Derde rapportage Project Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre.

Project gegevens in Ghana

Contactpersoon:

Adres:

Projectgebouw

GoodWorldGhana ltd, not-for-profit foundation

Adwoa Kuffour, managing director

17 block U Kwadaso North Kumasi

Kokobeng, 25 km ten Z-O van Kumasi

1) Inleiding

Het project 'Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre' is een vervolg op het project 'SMILE in transition' uit 2017. In dat project werden de faciliteiten van SMILE sterk verbeterd en werden onderwijsinhoudelijke aspecten zoals het vernieuwen en uitbreiden van de leermiddelen, bijscholing van leerkrachten, en een computerlokaal gerealiseerd.

Over dat project is verslag gedaan in de Eindrapportage 'SMILE' in Transition.

Mede dankzij dat project is SMILE nu professioneler en succesvoller.

Voor informatie over de achtergrond en het ontstaan van SMILE wordt verwezen naar eerdere verslagen, beschikbaar op de website van GoedWerkGhana.

2) Probleemstelling

Sinds 2021 is de school officieel geregistreerd als 'private school'. Behalve dat deze registratie een geruststellende erkenning voor de ouders is, geeft het ook nieuwe mogelijkheden en verplichtingen. De Ghanese overheid stimuleert bij privé scholen een systeem dat vergelijkbaar is met de 'Brede school' in Nederland. Dus opvang en onderwijs van 1 tot 15 jaar. De Ghanese overheid wil dat SMILE de leerlingen de mogelijkheid biedt na de Primary School nog 3 jaar door te gaan met de Junior Secondary School. Het bestuur van SMILE wil dat ook graag

Om dat te kunnen realiseren moet de school uitbreiden. Omdat de doorloop van de Junior Secondary School 3 leerling-jaren betekent, betekent dit een fysieke uitbreiding van 3 lokalen met eigen sanitair. De klassen hebben zo'n 20-25 leerlingen. Met het aantal kinderen dat nu op de Primary School zit verwacht de schoolleiding een A en B klas te kunnen vullen. De uitbreiding dient daarmee 6 lokalen, wc's, een bibliotheek, lerarenkamer en 2 kantoortjes te omvatten.

3) De uitvoering

Financiering en bouw van een nieuw lokaal is geen eenvoudige opgave gebleken.

Met behulp van giften van Stichting GoedWerkGhana, bijdragen van de ouders en een lening van de bank zijn er voldoende middelen bij elkaar gesprokkeld om de bouw te kunnen realiseren. De doorlooptijd is echter aanzienlijk langer geworden. Door een brand in 2023 werd het keukengebouw verwoest. Herbouw daarvan kreeg prioriteit.

De bouw van de nieuwe schoollokalen is in twee fasen uitgevoerd. Over de eerste fase is in 2023 in een eerste tussenrapportage¹ verslag gedaan. Eind 2024 is de tweede fase van de bouw afgerond. Ook daarvan is in de tweede tussenrapportage² verslag gedaan. De school is inmiddels in gebruik genomen.

¹ Tussentijdse rapportage Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre, 5-2-2023

² Tweede tussenrapportage Project Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre, 30-05-2025



In 2025 zijn er afrondende werkzaamheden verricht, zoals het aanleggen van de sanitaire voorzieningen. Het betreft een septictank (groot genoeg met het oog op de toekomst), een wc voor de meisjes en één voor de jongens, een urinoir en een wasbak. Overal vloertegels en wandtegels bij de wc's en wasbak.

Het sanitair kan uitgebreid worden; omdat twee wc's voor 50 leerlingen te weinig is.

De schoolleiding is uitermate tevreden met het resultaat en is blij dat de hygiëne en sanitaire omstandigheden voor de leerlingen een stuk zijn verbeterd. Schoolteam, ouders en leerlingen danken de Stichting GoedwerkGhana voor de bijdrage.

Zie ook de bijgevoegde foto's.

Via regelmatig contact met het schoolbestuur heeft de heer Van Heerik, verbonden aan GoedWerkGhana, zicht gehouden op de voortgang en het bestuur van GoedWerkGhana geadviseerd over de beschikbaarstelling van de middelen.

4) Financiële verantwoording van de afrondende werkzaamheden.

De werkzaamheden hebben 34.186 Ghanese Cedis gekost. Daarvan is door Stichting GoedwerkGhana 29.600 Cedis bijgedragen.

Inclusief valutakosten is dat omgerekend € 2.400,-

Zie de bijlage voor de specificaties

5) Conclusie

Ook dit deel van de werkzaamheden is correct en binnen de begroting uitgevoerd door het schoolbestuur van SMILE. Er is daardoor een goed functionerend schoolgebouw voor de Junior Secondary School.



Bijlage 1 Foto's van het nieuwe sanitair.





Bijlage 2 Detailoverzicht kosten

| EXPENDITURE FOR THE SANITATION PROJECT | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ITEMS | UNIT PRICE | QUANTITY | Planning | REALIZED |
| Workers for the digging of manhole | | | 3.500 | 3.500 |
| Blocks | 10 | 170 | 1.700 | 8.000 |
| Gravels | 4.000 | 1 | 2.000 | |
| Cement | 100 | 40 | 4.000 | 7.438 |
| Iron rod | 130 | 25 | 3.250 | 1.400 |
| Sand | 3.500 | 1 | 3.500 | 1.750 |
| Tiles | 400 | 17 | 6.800 | 2.250 |
| Sink | 600 | 2 | 1.200 | 1.374 |
| Watercloset | 1.000 | 3 | 3.000 | 680 |
| Unrite bowl | 1.000 | 1 | 1.000 | 785 |
| Plastering of manhole | | | 4.500 | 4.000 |
| Pipeline | 20 | 20 | 400 | 129 |
| Workship for the plumber | | | 2.000 | 700 |
| nails | | | | 70 |
| wawa formwork | | | | 500 |
| plywood | | | | 1.610 |
| TOTAL | | | 36.850 | 34.186 |
| Bijdrage GWG | | | | 29.600 |
| Eigen bijdrage Smile School | | | | 4.586 |
