




## Tweede tussenrapportage

## Project Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre.

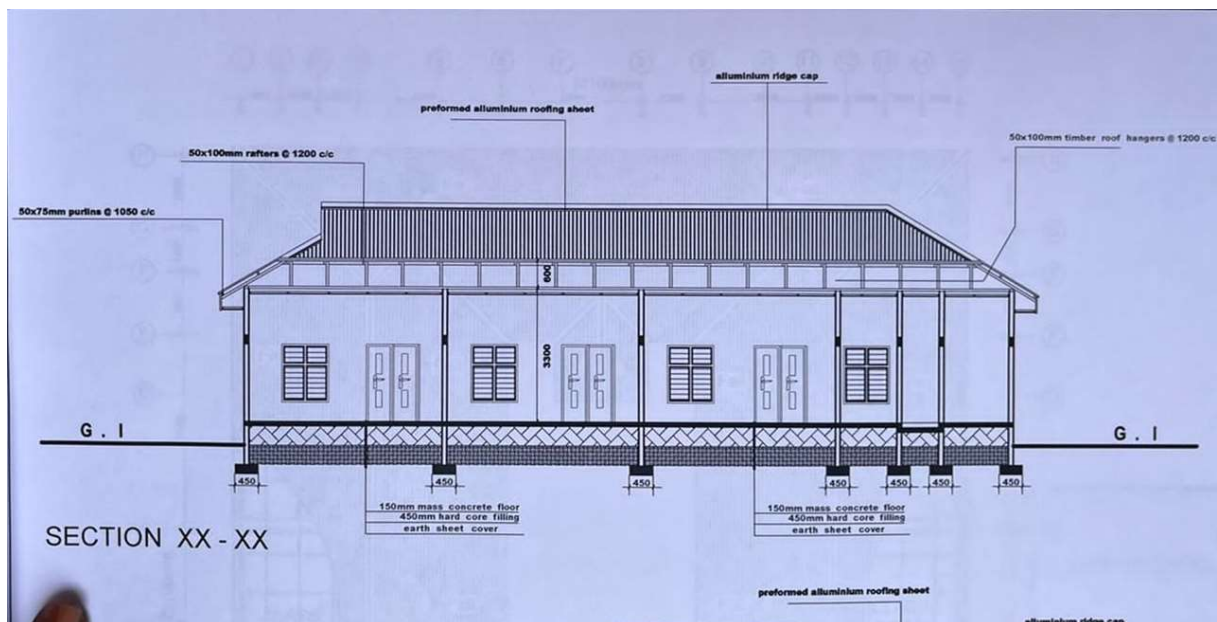

Titel: Tweede tussenrapportage Project Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre.

Versie: 1.0

Datum: 30-5-2025

Met bijdragen van: Harry van den Heerik, Barend Nieuwendijk

Stichting GoedWerkGhana  
www.goedwerkghana.nl



## **Tweede tussenrapportage Project Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre.**

### **Project gegevens in Ghana**

Contactpersoon:

Adres:

Projectgebouw

GoodWorldGhana Ltd, not-for-profit foundation

Adwoa Kuffour, managing director

17 block U Kwadaso North Kumasi

Kokobeng, 25 km ten Z-O van Kumasi

### **1) Inleiding**

Het project 'Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre' is een vervolg op het project 'SMILE in transition' uit 2017. In dat project werden de faciliteiten van SMILE sterk verbeterd en werden onderwijsinhoudelijke aspecten zoals het vernieuwen en uitbreiden van de leermiddelen, bijscholing van leerkrachten, en een computerlokaal gerealiseerd.

Over dat project is verslag gedaan in de Eindrapportage 'SMILE' in Transition.

Mede dankzij dat project is SMILE nu professioneler en succesvoller. Inmiddels is het leerlingenaantal gegroeid van 95 (eind 2017) naar 305 leerlingen begin 2022. Er zijn 12 leerkrachten.

Voor informatie over de achtergrond en het ontstaan van SMILE wordt verwezen naar eerdere verslagen, beschikbaar op de website van GoedWerkGhana.

### **2) Probleemstelling**

Sinds 2021 is de school officieel geregistreerd als 'private school'. Behalve dat deze registratie een geruststellende erkenning voor de ouders is, geeft het ook nieuwe mogelijkheden en verplichtingen. De Ghanese overheid stimuleert bij privé scholen een systeem dat vergelijkbaar is met de 'Brede school' in Nederland. Dus opvang en onderwijs van 1 tot 15 jaar. De Ghanese overheid wil dat SMILE de leerlingen de mogelijkheid biedt na de Primary School nog 3 jaar door te gaan met de Junior Secondary School. Het bestuur van SMILE wil dat ook graag

Om dat te kunnen realiseren moet de school uitbreiden. Omdat de doorloop van de Junior Secondary School 3 leerling-jaren betekent, betekent dit een fysieke uitbreiding van 3 lokalen met eigen sanitair. De klassen hebben zo'n 20-25 leerlingen. Met het aantal kinderen dat nu op de Primary School zit verwacht de schoolleiding een A en B klas te kunnen vullen. De uitbreiding dient daarmee 6 lokalen, wc's, een bibliotheek, lerarenkamer en 2 kantoortjes te omvatten.

### **3) De uitvoering**

Financiering en bouw van een nieuw lokaal is geen eenvoudige opgave gebleken.

Met behulp van giften van Stichting GoedWerkGhana, bijdragen van de ouders en een lening van de bank zijn er voldoende middelen bij elkaar gesprokkeld om de bouw te kunnen realiseren. De doorlooptijd is echter aanzienlijk langer geworden. Door een brand in 2023 werd het keukengebouw verwoest. Herbouw daarvan kreeg prioriteit.

De bouw van de nieuwe schoollokalen is in twee fasen uitgevoerd. Over de eerste fase is in 2023 in een eerste tussenrapportage<sup>1</sup> verslag gedaan.

---

<sup>1</sup> Tussentijdse rapportage Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre, 5-2-2023



Eind 2024 is de tweede fase van de bouw afgerond. Op de foto's in bijlage 1 wordt een indruk gegeven van de stand van zaken. De school is inmiddels in gebruik genomen ondanks dat er nog afrondende werkzaamheden nodig zijn aan het sanitair (septic tank en waterleiding), verlichting en plafonds.

Via regelmatig contact met het schoolbestuur heeft de heer Van Heerik, verbonden aan GoedWerkGhana, zicht gehouden op de voortgang en het bestuur van GoedWerkGhana geadviseerd over de beschikbaarstelling van de middelen.

#### **4) Financiële verantwoording tot en met de tweede fase.**

De kostenraming voor 6 lokalen, wc's, een bibliotheek, lerarenkamer en 2 kantoortjes bedroeg in 2022 130.000 Ghanese Cedis. Destijds was dat omgerekend € 18.500,- .

De Ghanese Cedis is in de afgelopen jaren aanzienlijk gedevalueerd: kreeg men in 2020-2022 zo'n 8 GhC voor 1 Euro, het afgelopen jaar steeg dat naar zo'n 13 tot soms zelfs 16 GhC. Met minder Euro's kon dus meer gebouwd worden. Daar tegenover stonden wel prijsstijgingen van bouwmaterialen.

In de eerste tussenrapportage is een kostenraming gemaakt voor de tweede bouwphase. Deze werd op 50.000 Cedis geraamd: omgerekend € 7.000,--.

Uit de verantwoording die door het schoolbestuur is ingediend, (zie bijlage 2) blijkt dat voor de tweede fase een bedrag van 70.000 Cedis is uitgegeven. Daarin zit overigens ook een bedrag voor schoolmeubilair opgenomen.

Die 70.000 Cedis zijn gefinancierd met de bijdrage vanuit Stichting Goed werk Ghana ten bedrage van € 5.000,-.

Tot en met de tweede fase heeft het project daarmee ruim 126.000 Cedis gekost.

De bijdrage vanuit Stichting GoedWerkGhana tot en met de tweede fase betreft een bedrag van € 10.000,--, Via bijdragen van de ouders en een lening van de bank is vanuit het schoolbestuur € 2.800,-- bijgedragen.

#### **5) Conclusie**

Het bestuur van Stichting GoedWerkGhana is verheugd dat het schoolbestuur van SMILE er in geslaagd is de bouw tot een goed einde te brengen waardoor er nu een functionerend schoolgebouw ter beschikking staat voor de Junior Secondary School. Hoewel er nog een aantal afrondende werkzaamheden zijn waar geld voor nodig is.


Met betrekking tot de financiële middelen is het een voordeel gebleken dat de Cedis is gedevalueerd ten opzichte van de Euro, waardoor er voldoende financiële middelen waren.

Stichting GoedWerkGhana zal zich inspannen om ook voor de laatste werkzaamheden nog financiële middelen te vinden.



Bijlage 1 Foto's van het nieuwe schoolgebouw.



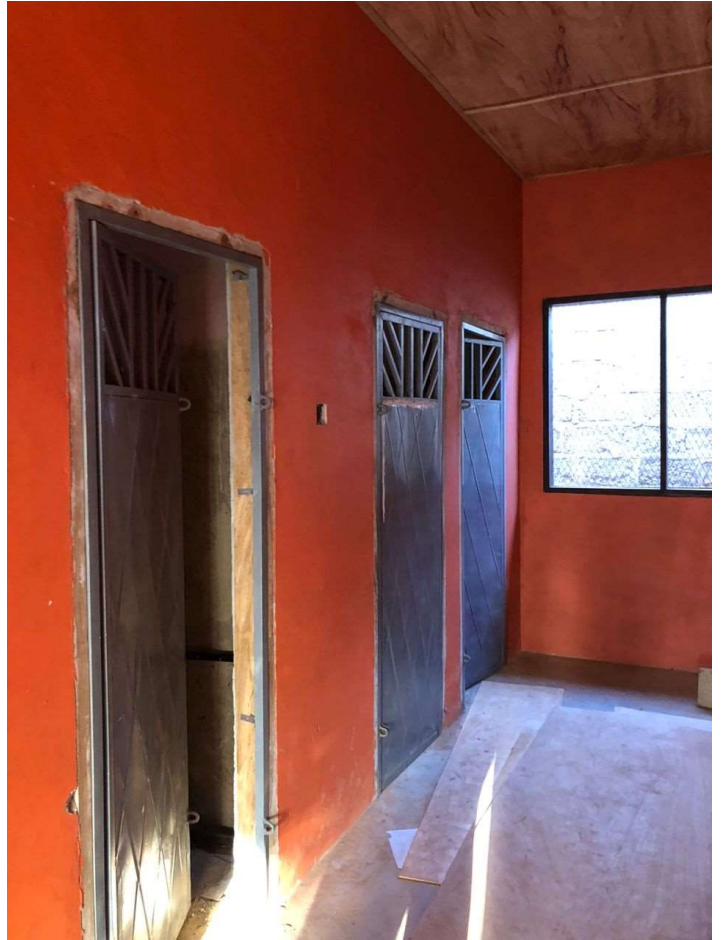



Bijlage 2 Kostenoverzicht bouw 2<sup>e</sup> fase

**Expenditures New School Building fase 2**

| no. | Item/Activities                        | Amount GhC     |                |
|-----|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | Equipment for electric installation *1 | 4.227          |                |
| 2   | Plywood, paint and nails *2            | 15.945         |                |
| 3   | Foreign boards *3                      | 2.480          |                |
| 4   | Cutting, edge band *4                  | 322            |                |
| 5   | Roofing sheets, nails *5               | 1.400          |                |
| 6   | Ceiba plywood, nails *6                | 1.570          |                |
| 7   | 2x2 wood 65pcs                         | 1.755          |                |
| 8   | Ceiling batons 40 pcs                  | 2.400          |                |
| 9   | Iron doors (single) 3 pcs              | 3.300          |                |
| 10  | Iron doors (double) 3 pcs              | 4.800          |                |
| 11  | School chairs 10 pcs                   | 5.600          |                |
| 12  | Welding for doors                      | 4.400          |                |
| 13  | Workmanship for ceiling                | 3.000          |                |
| 14  | Workmanship for painters               | 3.500          |                |
| 15  | Workmanship for carpenters             | 4.200          |                |
| 16  | Workmanship for doors                  | 2.500          |                |
| 17  | Workmanship for electricity            | 8.500          |                |
|     | <b>Total</b>                           | <b>€69.899</b> | <b>€70.000</b> |
